ESTADO DE OXACA DE JUÁREZ
PROGRAMA DE OBRA DE U.B.R. ACATLAN PEREZ FIGUEROA
MUNICIPIO ACATLAN PEREZ FIGUEROA
LOCALIDAD ACATLAN PEREZ FIGUEROA

AMPLIACIÓN UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ACATLAN PEREZ FIGUEROA
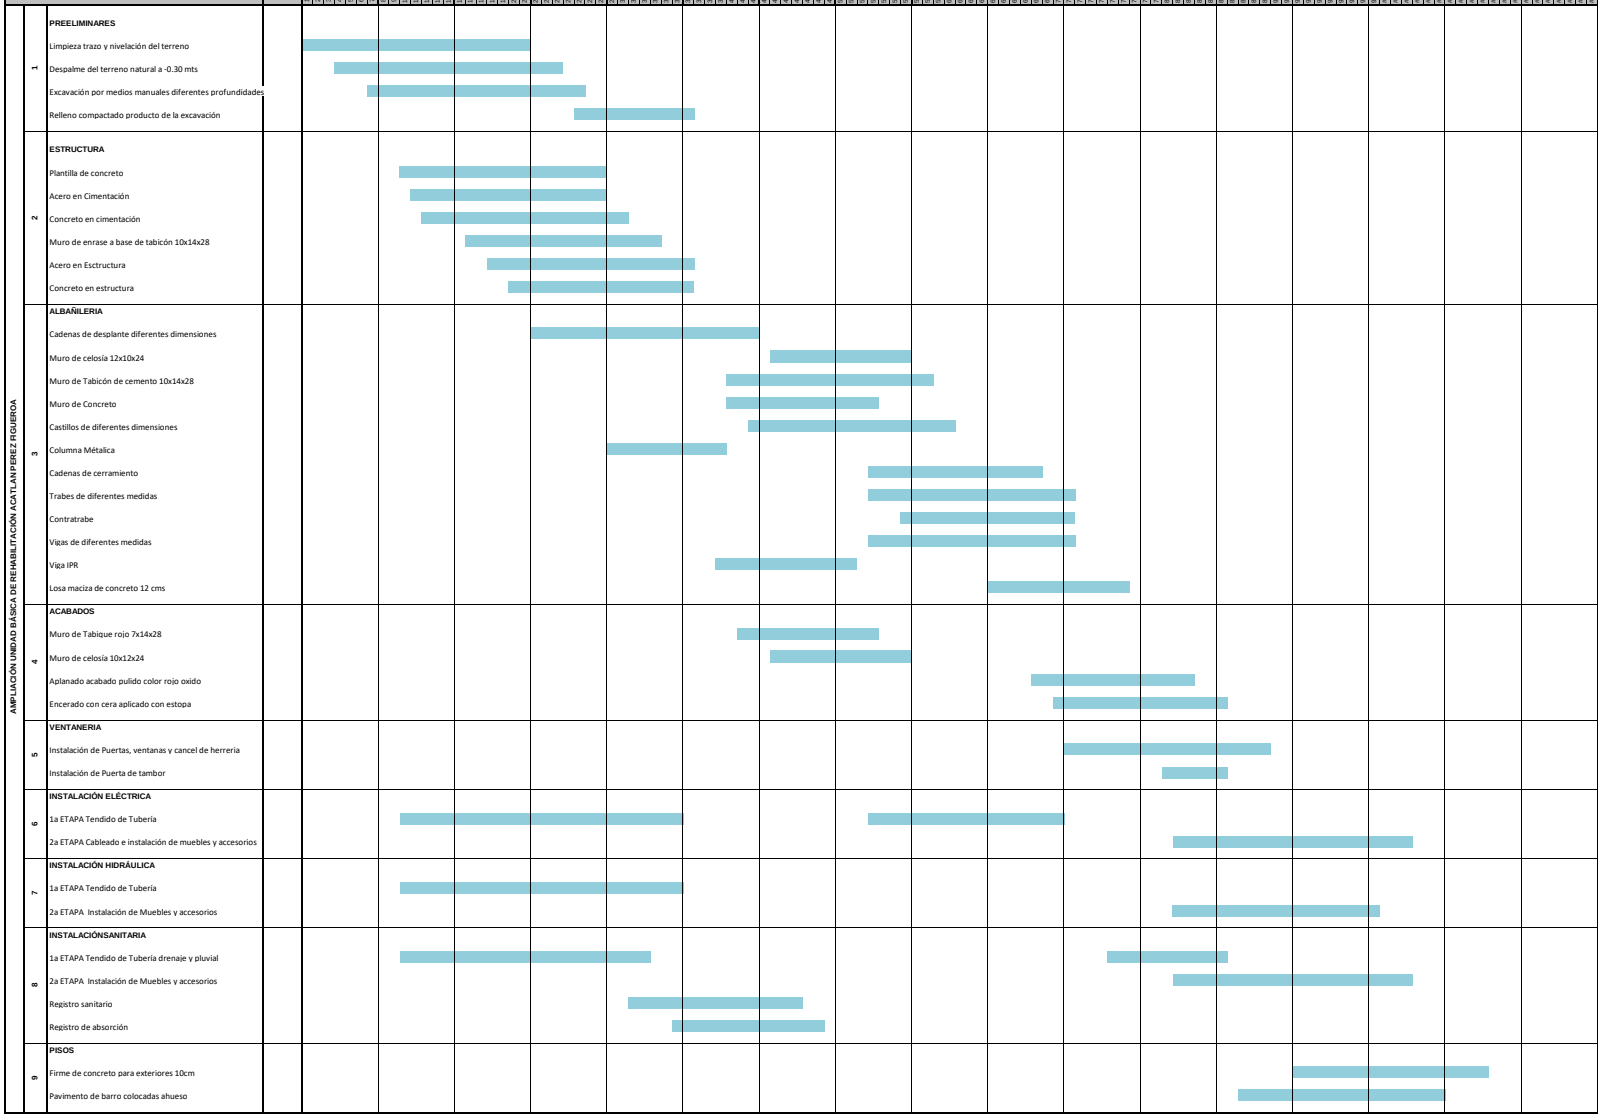
		PARTIDAS DE OBRA	Duración
1		**PREELIMINARES**	
		Limpieza trazo y nivelación del terreno	
		Despalme del terreno natural a -0.30 mts	
		Excavación por medios manuales diferentes profundidades	
		Relleno compactado producto de la excavación	
2		**ESTRUCTURA**	
		Plantilla de concreto	
		Acero en Cimentación	
		Concreto en cimentación	
		Muro de enrase a base de tabicón 10x14x28	
		Acero en Esctructura	
		Concreto en estructura	
3		**ALBAÑILERIA**	
		Cadenas de desplante diferentes dimensiones	
		Muro de celosía 12x10x24	
		Muro de Tabicón de cemento 10x14x28	
		Muro de Concreto	
		Castillos de diferentes dimensiones	
		Columna Métalica	
		Cadenas de cerramiento	
		Trabes de diferentes medidas	
		Contratrabe	
		Vigas de diferentes medidas	
		Viga IPR	
		Losa maciza de concreto 12 cms	
4		**ACABADOS**	
		Muro de Tabique rojo 7x14x28	
		Muro de celosía 10x12x24	
		Aplanado acabado pulido color rojo oxido	
		Encerado con cera aplicado con estopa	
5		**VENTANERIA**	
		Instalación de Puertas, ventanas y cancel de herreria	
		Instalación de Puerta de tambor	
6		**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**	
		1a ETAPA Tendido de Tubería	
		2a ETAPA Cableado e instalación de muebles y accesorios	
7		**INSTALACIÓN HIDRÁULICA**	
		1a ETAPA Tendido de Tubería	
		2a ETAPA Instalación de Muebles y accesorios	
8		**INSTALACIÓNSANITARIA**	
		1a ETAPA Tendido de Tubería drenaje y pluvial	
		2a ETAPA Instalación de Muebles y accesorios	
		Registro sanitario	
		Registro de absorción	
9		**PISOS**	
		Firme de concreto para exteriores 10cm	
		Pavimento de barro colocadas ahueso
